

**PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 - INFORME DE AVANCE META Nro. 63
DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA A.A.A.
EMSERCHÍA E.S.P.**

De acuerdo a las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 desde la Dirección Técnica Operativa de EMSERCHÍA E.S.P. se han desarrollado actividades que aportan al avance de los objetivos establecidos en el plan mencionado, a continuación, se describe el progreso de la meta durante el tiempo corrido del año 2025 con fecha de corte 30 de junio de 2025:

Información de la meta

Nro. Meta: 63
Meta Producto: Construir 5.415 metros lineales de redes de alcantarillado de los 51.910 priorizadas (proyectados en PMAA) en el municipio, contribuyendo con el cumplimiento de la Sentencia río Bogotá.
Indicador: Metros lineales construidos
Periodo Reportado: Mayo y junio de 2025

1. Actividades ejecutadas

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la meta Nro. 63, EMSERCHÍA E.S.P. ha realizado la contratación de diversos proyectos de obra, los cuales se relacionan a continuación con el respectivo avance del periodo indicado:

Nro. Contrato	Objeto	Total, Metros Lineales Ejecutados (ml)
CO-104-2024	Construcción de alcantarillado pluvial y reposición de alcantarillado sanitario del sector La Lorena del municipio de Chía.	1207.85 ml
CO-106-2024	Construcción del alcantarillado pluvial y reposición del alcantarillado sanitario del área aferente al centro administrativo municipal CAM, contempladas en el plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Chía	1101.75 ml

De igual manera se aclara que para el mes de mayo y junio de 2025 iniciaron los siguientes contratos que también son parte de las actividades generadas por EMSERCHIA E.S.P para dar cumplimiento a esta meta:

Nro. Contrato	Objeto	Total Metros Lineales Ejecutados (ml)
Contrato de Obra No 134 de 2024	Construcción De Alcantarillado Pluvial Y Reposición De Alcantarillado Sanitario Del Sector La Lorena Fase II Del Municipio De Chía.	293.88 ml
Contrato de Obra No 135 de 2024	Construcción de alcantarillado pluvial y reposición de alcantarillado sanitario calle 29 fase II	247 ml

2. Avance de la meta en 2025


A continuación, se refleja el avance de la meta de acuerdo a lo programado para el año 2025:

	Ejecución Por Vigencia	Proyección PDM	Porcentaje de ejecución
2024	1203.35	812.25	< 100 %
2025	4250.56	1624.5	< 100 %


Durante la vigencia 2025 (Mayo – Junio) se han instalado 1861.43 metros lineales lo que representa un avance mayor al 100 % de la meta planteada en el Plan Indicativo del Plan de Desarrollo Municipal.

3. Registro fotográfico

Contrato de Obra Nro. 104 de 2024: Alcantarillado La Lorena

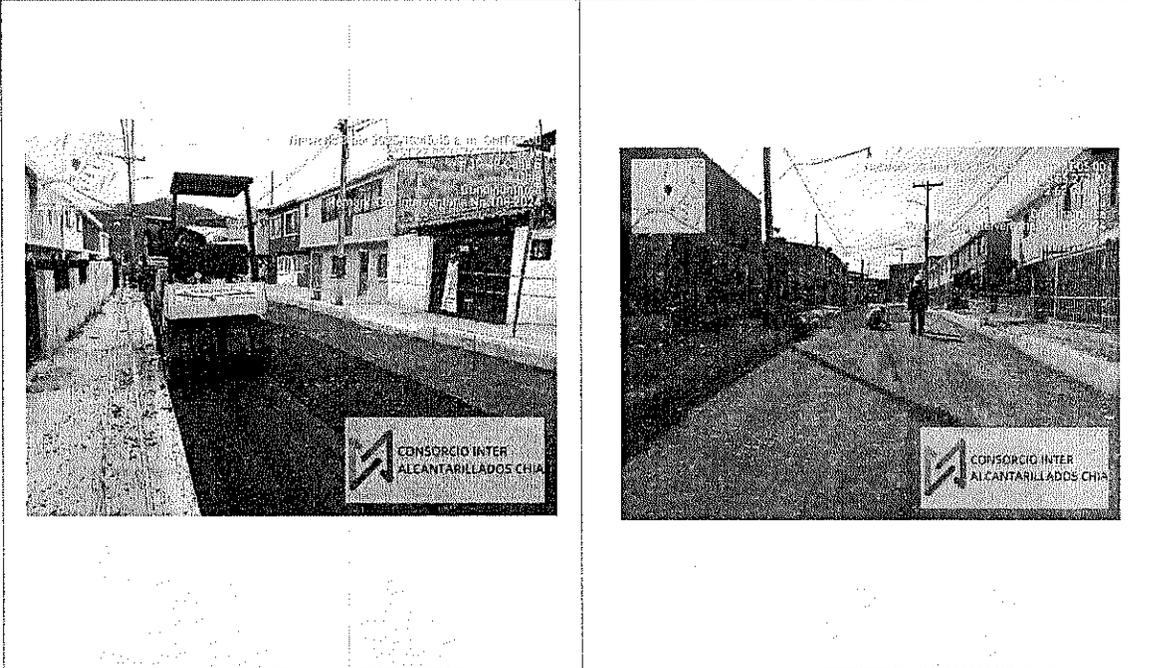



Contrato de Obra Nro. 106 de 2024: Alcantarillado CAM

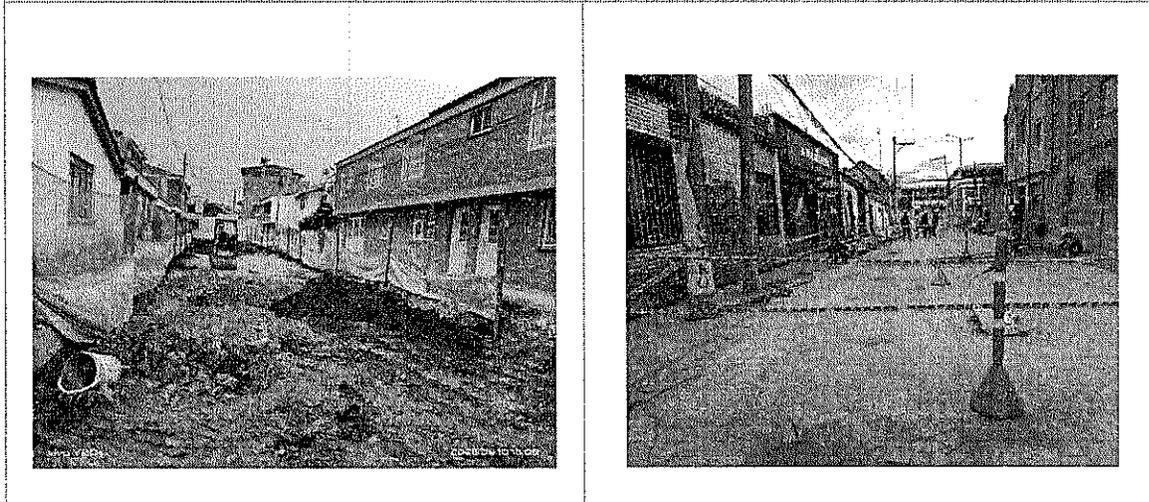

Contrato de Obra Nro. 134 de 2024: Alcantarillado La Lorena Fase II



Contrato de Obra Nro. 135 de 2024: Calle 29 Fase II

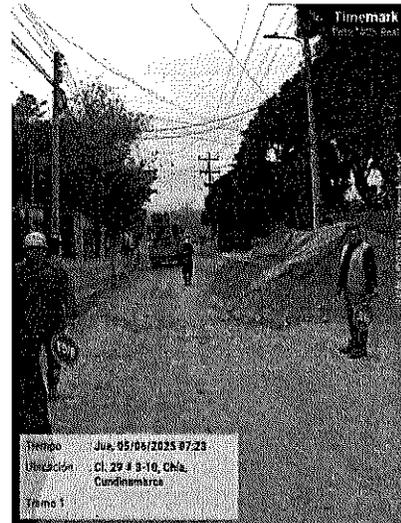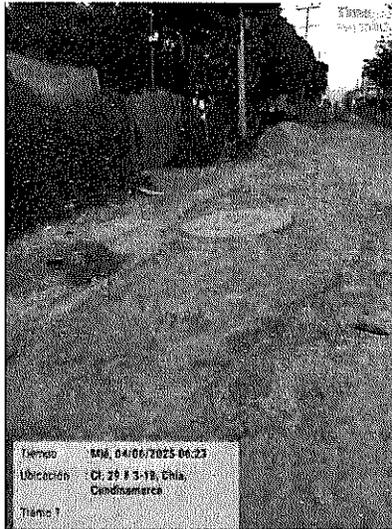

Cordialmente,

[Handwritten Signature]
MIGUEL ÁNGEL GIL POVEDA
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO A.A.A.
EMSERCHÍA E.S.P.
