



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

META 147. INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES

Fecha: 27/09/2024

OBJETO DEL PROCESO: Número de familias beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias.

Durante el tercer trimestre del año 2024, en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo "Fusagasugá Florece", y en particular de la meta 147, se llevó a cabo la liquidación de un contrato para la construcción de unidades sanitarias. En este contexto, se ejecutó la construcción de 28 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Fusagasugá.

A continuación, se muestra un registro fotográfico.

Descapote manual y retiro (E= 0.20 M, apile a 15 m)	
	
Replanteo manual de cimientos	
	
Excavación manual en material común (H=0.0 -2.0 m, incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)	



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)



RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE



Acero figurado 60.000 psi



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



VIGA DE AMARRE CONCRETO 3500 PSI



Red sanitaria PVC-S 4"



Muro en bloque No. 5 (E= 0.12)



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Acero figurado 60.000 psi



Columnas 3500 psi



Entrepiso placa maciza 3500 psi ($E= 0.12 M$)



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Afinado cubiertas planas en mortero 1:4 ($E = 0.03 \text{ M}$)



Impermeabilización integral mortero Sika



Refuerzo malla electrosoldada



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Placa base concreto 0.10 2500 psi



Alistado impermeabilizado pisos 1:3 (E= 0.04)





ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

Acometida en PVC 1/2" 5M



Tanque plástico elevado 500 LT (incluye accesorios e instalación)



Punto hidráulico PVC-P/paral 1/2"



Salida sanitaria PVC-S/paral 2"




ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Salida sanitaria PVC-S/paral 4"



Rejilla plástica Sosco 3x2

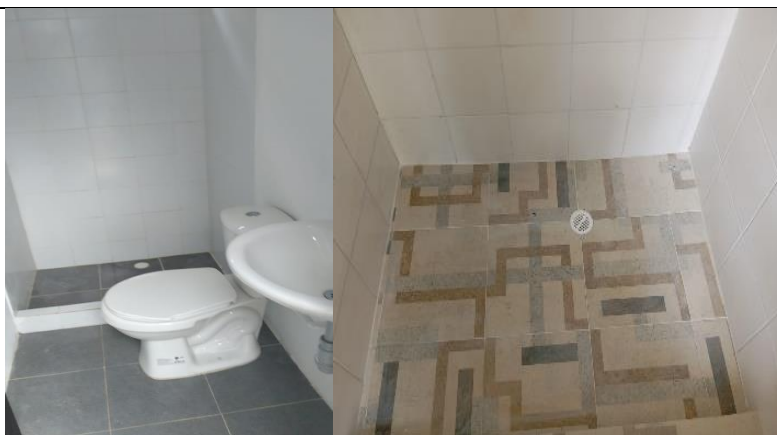

Salida lámpara toma pvc completa



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Pañete liso muros 1:4 (E= 1.5 CM) y Pañete liso muros 1:4 (E= 1.5 CM lineal)



Baldosa cerámica pared 20x20 calidad primera



Vinilo sobre pañete 2 manos



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)



Suministro e instalación ducha sencilla



Puerta en lámina cal 18 incluye anticorrosivo, MARCO PARA
PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 y Ventana lámina cal 18 incluye
anticorrosivo



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



SISTEMA SÉPTICO (Tradicional)

Excavación manual en material común (H=0.0 -2.0 m, incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)



Caja de inspección de 60 x 60



Excavación manual en material común (H=0.0 -2.0 m, incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Muro tolete común 0.12 M



Acero figurado 60.000 psi



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Entrepiso placa maciza 3500 psi ($E=0.12\text{ M}$)



Red sanitaria PVC-S 2"



Red sanitaria PVC-S 4"



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Excavación manual en material común (H=0.0 -2.0 m, incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)



Tubería drenaje pvc 110



"RELLENOS CON GRAVILLA (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)"




ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800
(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)"



Retiro de sobrantes a una distancia de 5 Km (incluye carga)

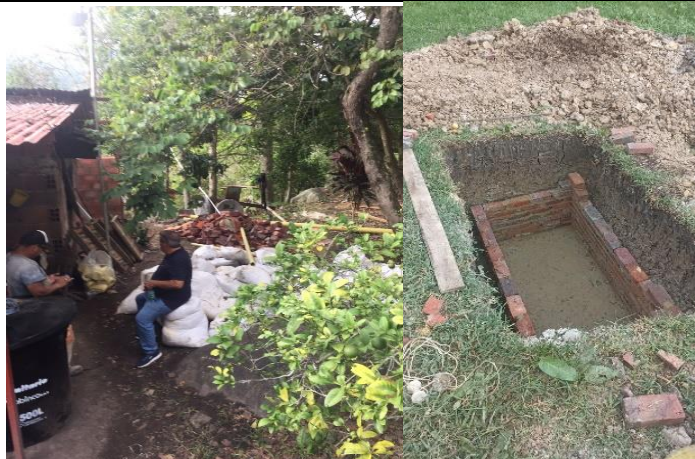

Así las cosas se solicita a la oficina de planeación cargar y reportar en el historial del cumplimiento de metas del plan de desarrollo vigente.
